

NGA- BREITBAND AUSBAU STADT WESTERKAPPELN



Zwischenstandsbericht

23. November 2021



**Deutsche
Glasfaser**

Förderprojekt Westerkappeln in Zahlen

Gebiet	Km gesamt	Investitionssumme	Mittelabrufe	Adressen	Wohneinheiten	Abgeschlossene Verträge Stand 31.10.21
Westerkappeln	198	10.494.308,39 €	5.400.000 €	870	1042	554

Meilensteine:

- 230 Anschlüsse wurden bereits in die, bzw. davor, Häuser gelegt.
- 100 aktive Kunden (Stand 12.11.21)

Stand 08.03.21:

- 125 Anschlüsse wurden bereits in die, bzw. davor, Häuser gelegt.
- 45 aktive Kunden

Ausbaugebiet Westerkappeln

Links:

Stand Ausbau 08.03.21

Rechts:



Stand Ausbau 12.11.21

Planung:

195km/36M = 6km/Monat

Ist:

128km/21M = 6km/Monat

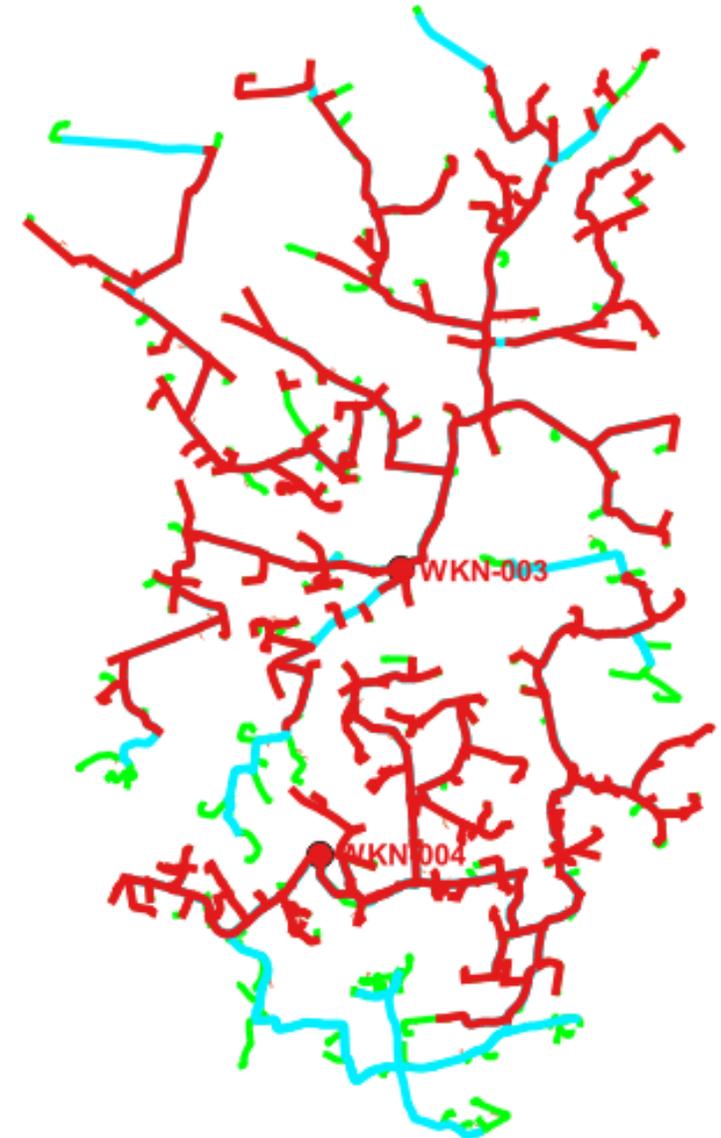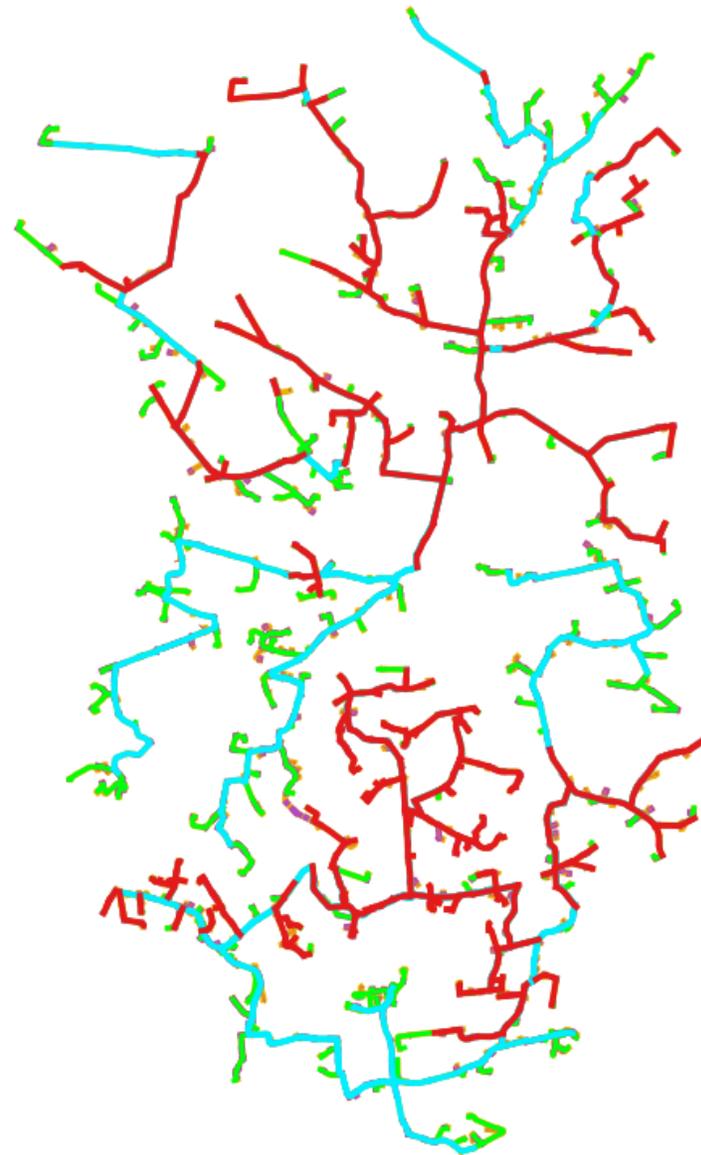

Ausbaugebiet Westerkappeln

Abschnitt	Start	Ende
Tiefbau wkn-005	01.2022	04.2022
Tiefbau wkn-006	04.2022	07.2022
Tiefbau wkn-007	02.2021	06.2021
Tiefbau wkn-008	10.2021	01.2022
Tiefbau wkn-009	10.2021	01.2022
Tiefbau wkn-010	12.2021	02.2022
Tiefbau wkn-011	06.2021	11.2021
Tiefbau wkn-012	10.2020	07.2021
Tiefbau wkn-013	06.2022	08.2022
Tiefbau wkn-014	12.2019	06.2021
Tiefbau wkn-015	09.2022	11.2022
Tiefbau wkn-016	03.2020	06.2021
Tiefbau wkn-017	11.2020	08.2021
Tiefbau wkn-018	01.2022	05.2022





VIELEN DANK

Henry van der Kamp

Projektleiter Bau

Torsten Höpfner

Programm Manager



**Deutsche
Glasfaser**
