



Deutsche
Glasfaser

Deutsche Glasfaser

NGA-Breitbandausbau Stadt Westerkappeln

09.06.2020, Westerkappeln

Agenda

1. Westerkappeln in Zahlen
2. Aktueller Stand Ausbau
3. Zeitplan

Förderprojekt Westerkappeln in Zahlen


Gebiet	Km gesamt	Investitionssumme	Mittelabrufe	Adressen	Wohneinheiten	Abgeschlossene Verträge Stand 15.03.21
Westerkappeln	195	10.147.865 €	3.100.000 €	870	1068	537

Meilensteine:


- 125 Anschlüsse wurden bereits in die, bzw. davor, Häuser gelegt.
- 45 aktive Kunden (Stand 08.03.21)

Ausbaugebiet Westerkappeln

Links:
Stand Ausbau 09.06.20

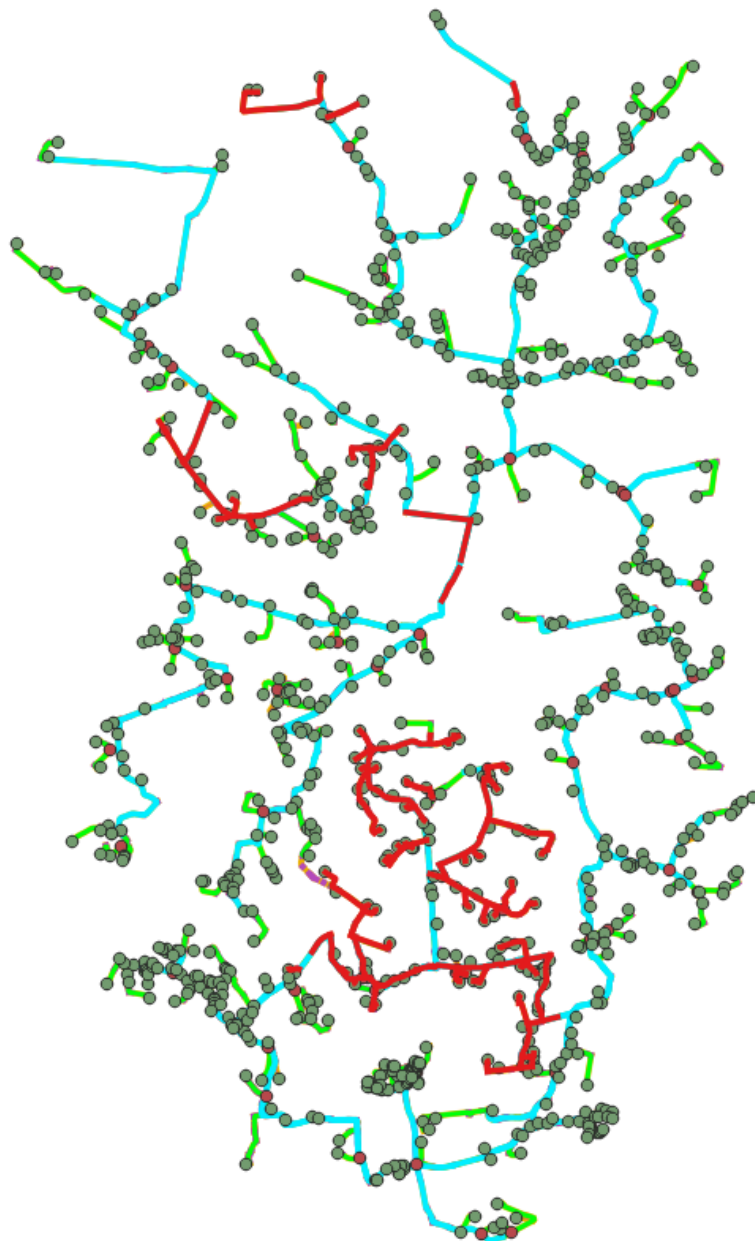

Rechts:
Stand Ausbau 08.03.21

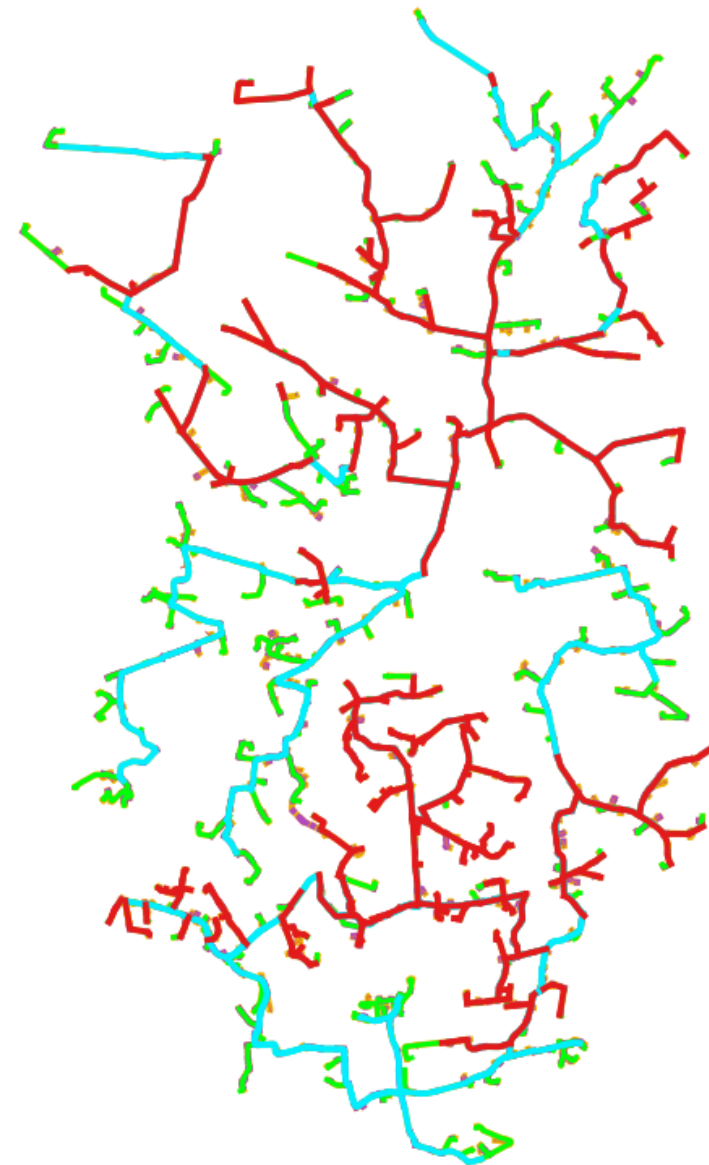


Planung:
 $195\text{km}/36\text{M} = 6\text{km}/\text{Monat}$

Ist:
 $85\text{km}/14\text{M} = 6\text{km}/\text{Monat}$



Ausbaugelände Westerkappeln

Abschnitt	Start	Ende
Tiefbau wkn-005	05.2021	08.2021
Tiefbau wkn-006	09.2021	12.2021
Tiefbau wkn-007	02.2021	04.2021
Tiefbau wkn-008	05.2020	08.2020
Tiefbau wkn-009	09.2020	12.2020
Tiefbau wkn-010	05.2021	07.2021
Tiefbau wkn-011	12.2020	02.2021
Tiefbau wkn-012	07.2020	09.2020
Tiefbau wkn-013	06.2022	08.2022
Tiefbau wkn-014	12.2019	02.2020
Tiefbau wkn-015	09.2022	11.2022
Tiefbau wkn-016	03.2020	06.2020
Tiefbau wkn-017	07.2020	10.2020
Tiefbau wkn-018	12.2021	04.2022

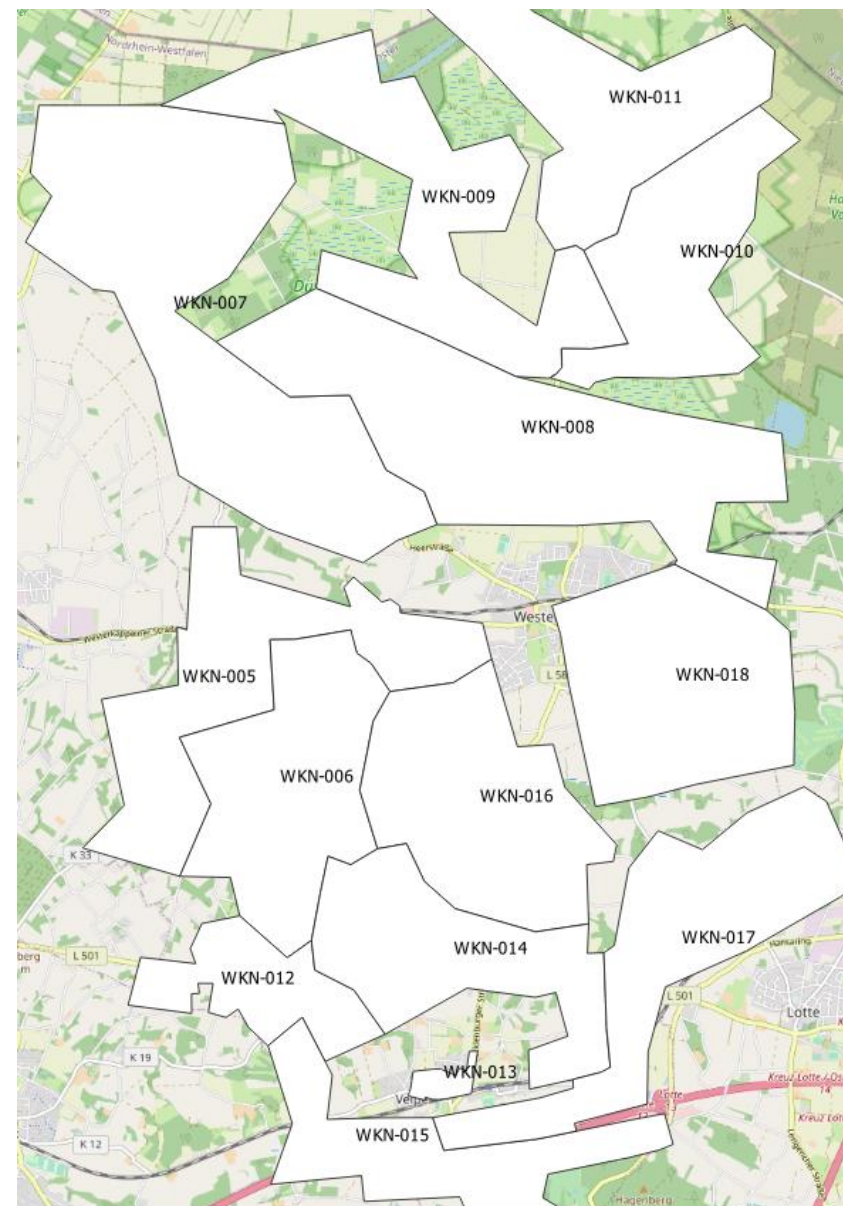


[illegible]

FCP Bereiche die durch den PoP WKN -004 versorgt werden


Standort: Hollenbergshügel / Ecke Ortfeld

Termin RFA 25.05.2020

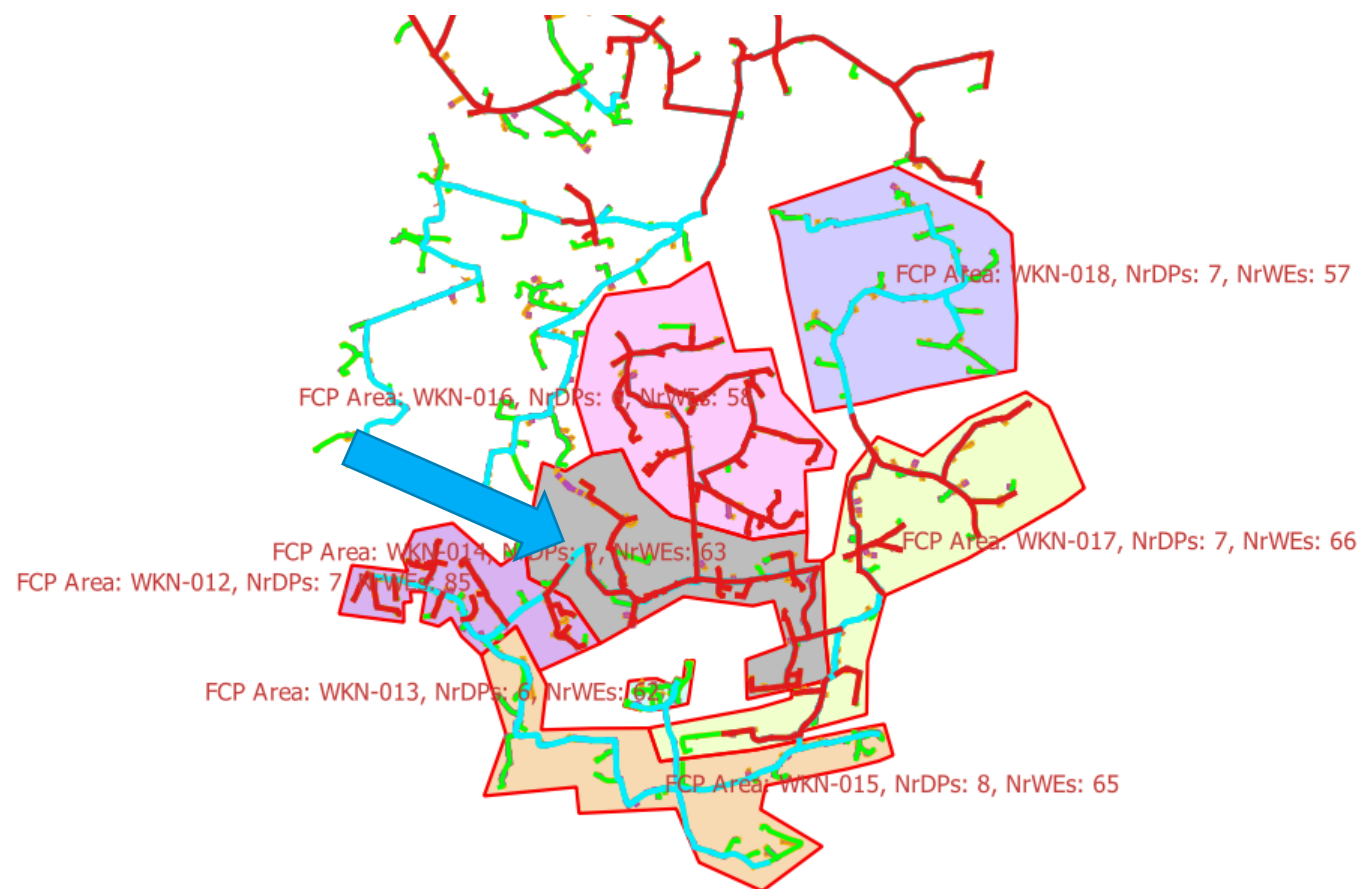

FCP Bereiche die durch den PoP WKN -003 versorgt werden

Standort: Mettinger Straße Termin RFA 07.05.2021

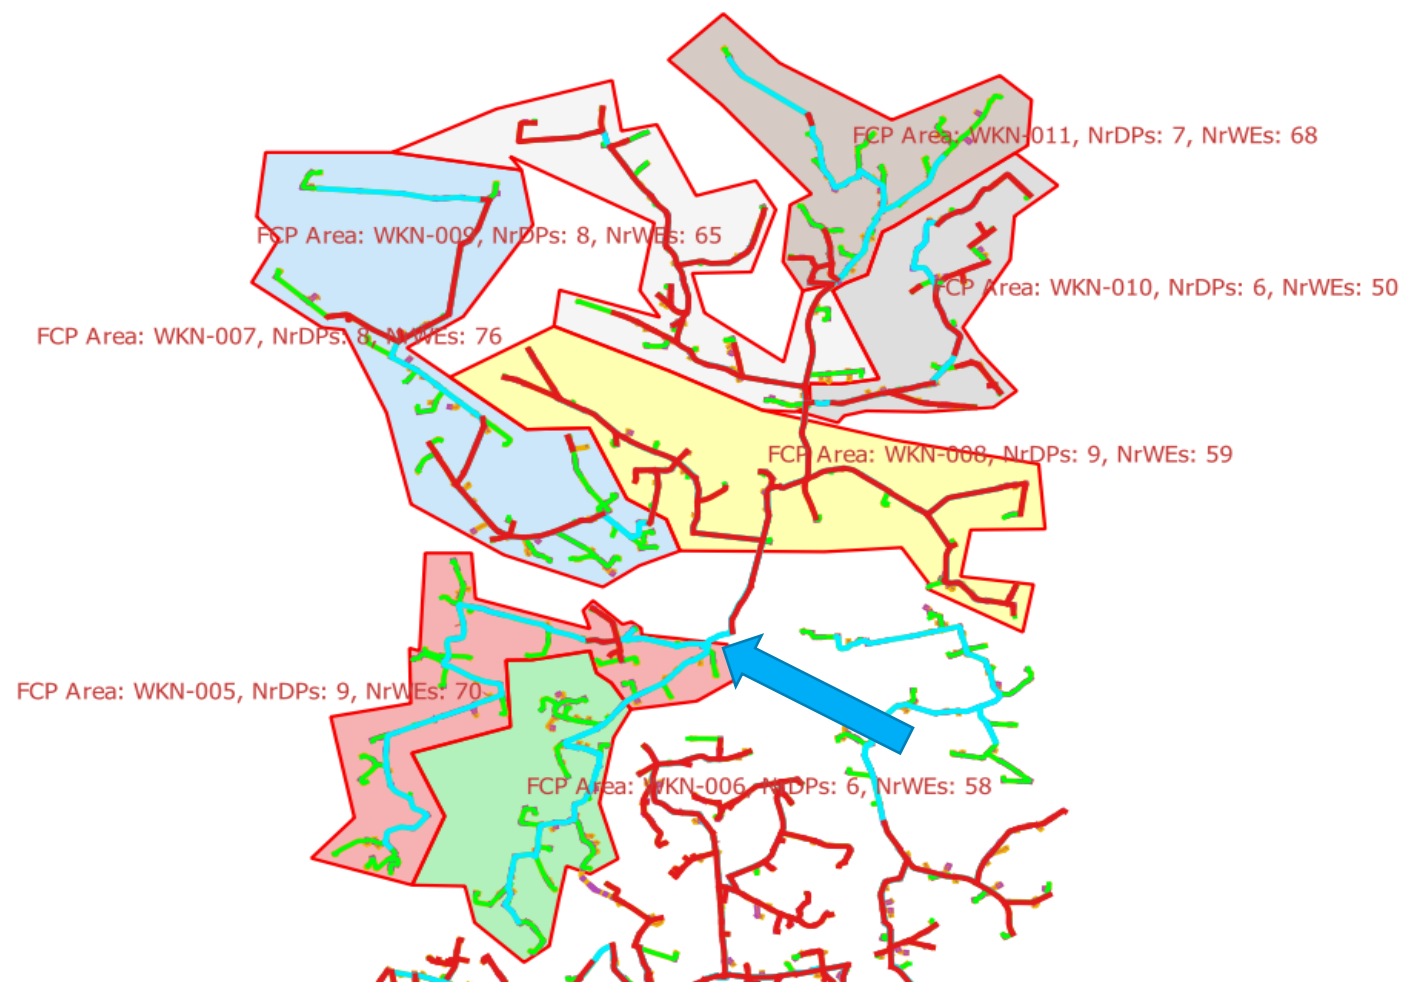



Deutsche Glasfaser

Gemeinsam in Richtung Zukunft



Deutsche
Glasfaser
